

湖南广立汽车零部件有限公司建设项目 阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：湖南广立汽车零部件有限公司

监测单位：湖南昌旭环保科技有限公司

编制时间：2023年11月





统一社会信用代码

91430100MA4Q185B7Q

营业执照

(副本)

副本编号: 1 - 1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 湖南昌旭环保科技有限公司

注册 资本 壹仟万元整

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成 立 日 期 2018年10月16日

法 定 代 表 人 朱丹

营 业 期 限 2018年10月16日 至 2068年10月15日

经 营 范 围 环保技术推广服务；环境与生态监测；职业病危害技术咨询、技术服务；辐射检测与评价服务；职业病危害因素检测与评价；食品检测服务；建筑消防设施检测服务；公路与桥梁检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所 长沙经济技术开发区泉塘街道螺丝塘路68号星沙国际企业中心11栋804、805、806

登 记 机 关



2020 年 10 月 15 日



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：191812051825

名称：湖南昌旭环保科技有限公司

地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道螺丝塘路68号星沙国际企业中心11栋804、805、806

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由湖南昌旭环保科技有限公司承担。

许可使用标志



191812051825

发证日期：2019年07月17日

有效期至：2025年07月16日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

前 言

湖南广立汽车零部件有限公司租赁租用浏阳市盛大家具厂空置的厂房及土地，利用现厂房的前提下，新建一栋钢构厂房，进行塑料汽车零部件制品的生产。项目总投资 600 万元，生产规模为项目生产规模为年产卡扣 100 万件、汽车风道总成 67 万件、驾驶座车枕 50 万件。因目前仅建设部分生产设备，本次为阶段性验收，验收内容为年产卡扣 67 万件、汽车风道总成 45 万件生产线主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程。

湖南广立汽车零部件有限公司于 2022 年 5 月委托湖南亿兴环保技术服务有限公司编制《湖南广立汽车零部件有限公司建设项目环境影响报告表》，长沙市生态环境局于 2022 年 6 月 27 日以“（长环评（浏阳）【2022】122 号）”下达该项目的批复。项目于 2023 年 11 月 6 日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91430181MA4Q39LC0A001X），有效期至 2028 年 11 月 05 日。目前项目生产设施和配套的环保设施正式投入使用并且运行正常，无环保投诉，企业启动阶段性自主环保验收工作。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部[2018]9 号）的规定和要求，我公司组织专业技术人员成立项目验收工作组开展本公司阶段性竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表及批复内容，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，根据自查结果编制了自查报告及验收监测方案，并委托湖南昌旭环保科技有限公司对本公司的排污状况进行了现场监测，监测时间为 2023 年 11 月 13~14 日，监测期间我公司正常生产，满足验收监测条件。我公司验收工作组经过对项目现场的仔细勘察和资料整理，根据项目对环评报告及批复落实的情况，环保设施的建设及运行情况，并结合湖南昌旭环保科技有限公司出具的监测报告编制了《湖南广立汽车零部件有限公司建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》。

表一

建设项目名称	湖南广立汽车零部件有限公司建设项目				
建设单位名称	湖南广立汽车零部件有限公司				
建设项目性质	新建				
建设地点	浏阳市北盛镇乌龙社区				
主要产品名称	汽车卡扣、汽车风道总成、驾驶座车枕				
设计生产能力	年产汽车卡扣 100 万件；汽车风道总成 67 万件；驾驶座车枕 50 万件				
实际生产能力	年产汽车卡扣 67 万件；汽车风道总成 45 万件（本次为阶段性验收）				
建设项目环评时间	2022 年 6 月	开工建设时间	2022 年 6 月		
调试时间	2023 年 10 月	验收现场监测时间	2023 年 11 月		
环评报告表审批部门	长沙市生态环境局	环评报告表编制单位	湖南亿兴环保技术咨询服务有限责任公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	湖南广立汽车零部件有限公司		
投资总概算	600 万元	环保投资总概算	25 万元	比例	4.17%
实际总概算	600 万元	环保投资	20 万元	比例	3.33%
验收监测依据	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订，2015 年 1 月 1 日起实施）；</p> <p>(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订并施行）；</p> <p>(3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修正，2018 年 1 月 1 日施行）；</p> <p>(4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）；</p> <p>(5) 《中华人民共和国环境噪声防治法》（2021 年 12 月 25 日修订并施行）；</p> <p>(6) 《国家危险废物名录》2021 年版；</p> <p>(7) 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评【2017】4 号）2017 年 11 月 20 日；</p>				

	<p>(8) 生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》的公告(2018年第9号)；</p> <p>(9) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国务院令 第682号，2017年7月16日发布，2017年10月1日起实施；</p> <p>(10) 国家环境保护局《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)；</p> <p>(11) 《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函〔2020〕688号)；</p> <p>(12) 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》2000年2月22日，环发【2000】38号；</p> <p>(13) 《湖南广立汽车零部件有限公司建设项目环境影响报告表》，(湖南亿兴环保技术咨询有限公司，2022年5月)；</p> <p>(14) 长沙市生态环境局《关于湖南广立汽车零部件有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(长环评(浏阳)【2022】122号)，2022年6月27日)；</p> <p>(15) 建设单位提供的其他资料。</p>																
<p>验收监测评价标准、标号、级别、限值</p>	<p>1、污水排放标准</p> <p>项目无废水外排，无废水排口，不设置废水排放标准。</p> <p>2、废气排放标准</p> <p>本项目产生的非甲烷总烃、甲醛、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5及表9规定的大气污染物特别排放限值。恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1和表2标准。具体见下表：</p> <p>表 1-1 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)</p> <table border="1" data-bbox="467 1700 1353 1935"> <thead> <tr> <th>污染物</th> <th>最高允许排放浓度 (mg/m³)</th> <th colspan="2">无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非甲烷总烃</td> <td>60</td> <td colspan="2">4.0</td> </tr> <tr> <td>甲醛</td> <td>5</td> <td colspan="2">/</td> </tr> <tr> <td>颗粒物</td> <td>20</td> <td>周界外浓度最高点</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)		非甲烷总烃	60	4.0		甲醛	5	/		颗粒物	20	周界外浓度最高点	1.0
污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)															
非甲烷总烃	60	4.0															
甲醛	5	/															
颗粒物	20	周界外浓度最高点	1.0														

表 1-2 恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)

指标	污染物排放标准		厂界标准值	
	排气筒高度 (m)	排放速率	监控点	浓度
臭气浓度	15	2000 (无量纲)	厂界	20 (无量纲)

3、噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 2 类标准, 具体见下表:

表 1-3 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348—2008)

类别	时段	标准值 (dB(A))
厂界噪声	昼间	60
	夜间	50

4、固体废物排放标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020); 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

表二

工程建设内容:

湖南广立汽车零部件有限公司租赁租用浏阳市盛大家具厂空置的厂房及土地,利用现厂房的前提下,新建一栋钢构厂房,进行塑料汽车零部件制品的生产。项目总投资 600 万元,生产规模为项目生产规模为年产卡扣 100 万件、汽车风道总成 67 万件、驾驶座车枕 50 万件。因目前仅建设部分生产设备,本次为阶段性验收,现生产规模为年产卡扣 67 万件、汽车风道总成 45 万件。

1、建设内容及规模

经现场踏勘及资料核对,项目建设内容与环评阶段基本一致,未发生较大变化。项目环评阶段与实际建设情况对比情况见表 2-1。

表 2-1 项目主要建设内容

项目	建设名称	环评及批复阶段建设内容	实际建设情况	备注
主体工程	生产车间 1	钢构厂房,占地面积约 2125 平方米,设原料仓库、生产车间、成品仓库等	钢构厂房,占地面积约 2125 平方米,设原料仓库、成品仓库等	调整
	生产车间 2	钢构厂房,占地面积约 4755.76 平方米,设原料仓库、生产车间、成品仓库等	钢构厂房,占地面积约 4755.76 平方米,设原料仓库、生产车间、成品仓库等	无变化
办公生活	办公区	建筑面积约 50 m ² ,用于员工办公	建筑面积约 50 m ² ,用于员工办公	无变化
公用工程	供电	区域电网	区域电网	无变化
	供水	供水由市政供水	供水由市政供水	无变化
	排水	雨污分流	雨污分流	无变化
环保工程	大气污染防治	项目一车间有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放;二车间有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放。	项目一车间暂无产污设施,仅用作为仓库,无废气处理设施;二车间有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放。	调整
	水污染防治	项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地和农田菜地施肥;间接冷却水循环使用,不外排。	项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地和农田菜地施肥;间接冷却水循环使用,不外排。	无变化
	噪声防治	距离衰减、车间减振、建筑隔声及厂界绿化	距离衰减、车间减振、建筑隔声及厂界绿化	无变化
	固体废物处置	生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置;注塑及吹塑边角料经破碎后回用于生	生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置;注塑及吹塑边角料经破碎后回用于生	无变化

		产；一般废包装材料收集后外售；废包装桶、废矿物油、含油抹布和手套、废活性炭暂存危废间后委托有资质单位安全处置。	产；一般废包装材料收集后外售；废包装桶、废矿物油、含油抹布和手套、废活性炭暂存危废间后委托有资质单位安全处置。	
--	--	---	---	--

2、环保投资

本项目投资约 600 万元，环评中环保投资 25 万元，约占总投资的 4.17%；实际环保投资 20 万元，占总投资的 3.33%。投资费用估算见下表。

表 2-2 项目环保投资一览表

类别	污染源	环评拟定环保设施设备	实际环保设施设备	环评投资概算（万元）	实际投资（万元）
废气	有机废气	2 套集气罩收集+二级活性炭吸附装置+不低于 15m 排气筒	1 套集气罩收集+活性炭吸附装置+15m 排气筒	20	15
废水	生活污水	化粪池	化粪池	3	3
噪声	噪声设备	基础减震、隔声	基础减震、隔声	0.5	0.5
固废	垃圾桶及一般固废间		垃圾桶及一般固废间	0.5	0.5
	危废暂存间等		危废暂存间	1	1
总计				25	20

3、环保投诉情况

本项目在建设及运行过程中严格按照环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施组织施工建设和运营。在施工期、运营期间未发生相关的投诉或纠纷事件。

原辅材料消耗及水平衡：

1、主要生产设备

主要设备见下表。

表 2-3 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评设计数量	实际数量	备注
1	吹塑机	15 台	10 台	发泡设备未投入使用，部分吹塑机和注塑机未安装，本次为阶段性验收
2	注塑机	15 台	10 台	
3	发泡机	4 台	1 台（购置后闲置未使用）	
4	破碎机	1 台	2 台	
5	冷却塔（1t）	2 台	1 台	
6	工装机	/	28 台	新增
7	磨床	/	2 台	新增

2、主要生产产品

项目主要生产产品见下表。

表 2-4 项目产品一览表

产品名称	环评设计年产量	实际年产量	备注
汽车卡扣	100 万件	67 万件	发泡设备未投入使用，部分吹塑机和注塑机未安装，本次为阶段性验收
汽车风道总成	67 万件	45 万件	
驾驶座车枕	50 万件	/	

3、主要原辅材料

项目主要原辅材料见下表。

表 2-5 项目主要原辅材料

序号	材料名称	环评设计年消耗量 (t)	实际年消耗量 (t)	包装规格	备注
1	HDPE(高密度聚乙烯)	300	200	25kg/袋	部分设备未建设
2	POM(聚甲醛树脂)	100	67	25kg/袋	部分设备未建设
3	PAPI(多苯基多亚甲基多异氰酸酯)	24	/	/	发泡设备暂未投入使用
4	聚醚多元醇	12	/	/	

4、水源及水平衡

(1) 供水：供水由市政供水。

(2) 排水：项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地和农田菜地施肥；间接冷却水循环使用，不外排。

(3) 供电：本项目用电来源于区域乡村电网。

主要工艺流程及产物环节：

项目主要生产工艺流程及产污环节见下图：




图 3-1 项目风道总成工艺流程及产污节点示意图

生产主要工艺流程简述：

将外购的 HDPE 新料投入吹塑机中，进行吹塑后得到成品。本项目吹塑温

度约为 210℃，HDPE 分解温度为 320℃，因此吹塑过程中 HDPE 不会分解。

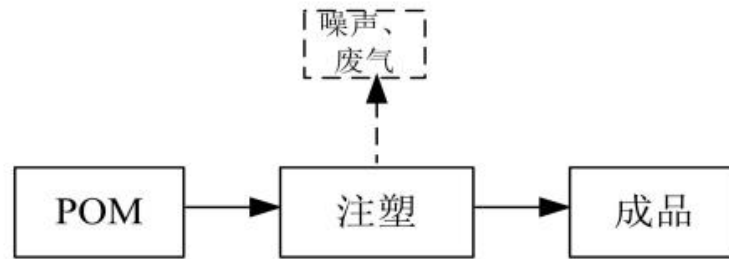


图 3-1 项目卡扣工艺流程及产污节点示意图

生产主要工艺流程简述：

将外购的 POM 新料投入注塑机中，进行注塑后得到成品。本项目注塑温度约为 180℃，POM 分解温度为 280℃，因此注塑过程中 POM 不会分解。

5、项目变动情况

对比项目环评及批复内容，项目变动具体情况如下：

表 4-2 项目变更情况汇总表

类别	环评及环评批复建设内容		实际建设内容	备注
主体工程	生产车间 1	钢构厂房，占地面积约 2125 平方米，设原料仓库、生产车间、成品仓库等	钢构厂房，占地面积约 2125 平方米，设原料仓库、成品仓库等	发泡设备未投入使用，部分吹塑机和注塑机未安装，本次为阶段性验收
设备	工装机 0 台，磨床 0 台，破碎机 1 台		工装机 28 台（用于产品切口，不同型号产品需用不同型号的工装机） 磨床 2 台（用于工装机刀片维护） 破碎机 2 台（用于边角料破碎）	
废气	项目一车间有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放；二车间有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放。		项目一车间暂无生产设备，仅用作为仓库，无废气处理设施；二车间有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放。	

本项目变动情况与《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）对照见下表。

表 4-3 本项目与重大变更清单对照表

类别	属于变更情形	实际情况	是否为重大变更
性质	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。	项目性质无变化	否
规模	2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。	项目汽车卡扣及	否

	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的	汽车风道总成生产规模占环评设计生产规模66.67%，驾驶座车枕生产线暂未建设。本次为阶段性验收	否
	4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。		否
地点	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	项目地点无变化	否
生产工艺	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。	项目主要生产工艺无变化，设备增加了工装机和磨床。工装机用于成型产品切口，磨床用于工装机刀片维护，仅产生少量颗粒物。不新增污染物排放种类	否
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	物料运输、装卸、贮存方式无变化	否
环境保护措施	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	项目一车间暂无产污设施，仅用作仓库，无废气处理设施	否
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	无废水排放口	否
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。	未新增排放口	否
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。	噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化	否
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行，利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	固废处置方式无变化	否
综上所述，本项目无重大变更情况。			

表三

主要污染源、污染物处理和排放：

1、废水

本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水。

项目劳动定员约为 30 人，按照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），项目员工办公用水参照办公楼用水，办公生活用水按 38 L/人·d 计，则生活用水量为 1.14t/d（342 t/a）。排污系数取 0.8，则生活污水量为 0.912m³/d、273.6m³/a。项目生活废水进入化粪池处理后用作农肥。

项目注塑机、吹塑机冷却水用量为 120 t/a，补充水量以用水量的 10%计，则补充水量为 12 t/a。冷却水为间接冷却，因而其水质较为简单，项目冷却水定期补充，循环使用不外排。

2、废气

厂区废气主要为注塑和吹塑产生的有机废气和破碎产生的粉尘，有机废气经集气罩收集后经活性炭处理 15m 排气筒外排，破碎粉尘经车间通风后无组织排放。

3、噪声

本项目产生的噪声包括机械设备运行噪声及通风除尘等设备噪声，项目主要产噪设备均位于室内，通过选用低噪声设备，采取隔音、减振、合理布局等措施。对周围环境不会产生明显影响。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；注塑及吹塑边角料经破碎后回用于生产；一般废包装材料收集后外售；废包装桶、废矿物油、含油抹布和手套、废活性炭暂存危废间后委托有资质单位安全处置。采取以上措施后，项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、环境影响报告表主要结论

本项目符合国家现行产业发展政策，选址符合环境功能区划要求。项目在运行中产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目的建设具备环境可行性。

2、环境影响报告表主要建议

(1) 在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。

(2) 做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。

(3) 建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。

(4) 不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

3、审批部门审批决定

由长沙市生态环境局浏阳分局对该项目环评报告表予以批复，批复文号：长环评（浏阳）【2022】122号，批复内容详见附件。

4、环评报告及批复要求落实情况检查

《湖南广立汽车零部件有限公司建设项目》的建设履行了环境影响审批手续，根据环境影响报告表和长沙市生态环境局浏阳分局批复要求，按照初步设计环保篇进行了环保设施的建设，做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。该项目实际建设地点、生产设备、实际生产方案、生产规模、总投资额等都与批复内容基本相符。环评批复要求及建设落实情况对照见下表。

表 4-1 环评批复落实情况对照表

批复要求	落实情况	是否落实
(一)项目应加强水污染控制,切实做好雨污分流。项目厂区内不设食宿,一般生活污水经化粪池处理	厂区雨污分流,生活废水经化粪池处理后由周边农户清	已落实

后再用作农肥，需配套设置灌溉设施；间接冷却水循环使用，不外排。本项目不设置废水排放口。	掏至粪桶内于周边农田施肥；间接冷却水循环使用，不外排无废水排口	
（二）项目应加强大气污染控制。项目需在注塑机、吹塑机、发泡机设备上设置集气罩，注塑、吹塑、发泡工序产生的废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理再通过不低于 15 米高的排气筒排放；另需采取加强生产管理、破碎过程密封、定期清扫等措施，确保项目有机废气、颗粒物排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 及表 9 规定的相应限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。	发泡机暂未安装，在注塑机和吹塑机上方设置有集气罩，收集后经活性炭处理后通过 15m 排气筒外排，破碎工序在密闭空间内进行。监测报告中各因子检测结果均符合标准要求。	已落实
（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准。	选用了低噪声设备，对生产噪声较大的设备采取减震、隔声处理。监测报告中各因子检测结果均符合标准要求。	已落实
（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目运营期产生的废包装材料收集后外售物资回收公司；边角料经破碎机破碎后回用于生产。废活性炭、废矿物油、废含油抹布和手套等危废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013 年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。	项目产生废边角料和不合格产品经破碎后回用于生产，废包装材料收集后送至废品回收站进行综合利用；废矿物油、废矿物油桶、废活性炭收集后暂存危废间交由有资质公司处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。	已落实
（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。	废气排污口已按国家环保部的有关规定设置统一的标志。	已落实
（六）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。	已建立环境保护管理制度，严格按照要求落实。	已落实
根据表 4-1 对照结果，项目环评批复要求措施 6 条，项目均基本落实。		

表五

1、监测分析方法及监测仪器

本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司进行验收监测。该公司通过了湖南省质量技术监督局计量认证，具备国家有关法律、行政法规规定的条件和能力。在监测过程中，科学设计监测方案，合理布设监测点位，严格按照技术规范操作，保证监测数据的完整性、可靠性和准确性。样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照国家相关技术规范和标准分析方法的要求进行。对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制，监测数据采用三级审核制。具体见下表。

表 5-1 监测分析方法

类别	项目	分析方法及方法来源	使用仪器	最低检出限
有组织废气	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及修改单 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017	FB1055 型 电子天平	1.0mg/m ³
	非甲烷总烃	《固定污染源 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ38-2017	GC-4000A 型 气相色谱仪	0.07mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993	气袋	/
	甲醛	《空气质量 甲醛测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T15516-1995	752 型 紫外可见分光光度计	0.5mg/m ³
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及修改单	FB1055 型 电子天平	0.001mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993	气袋	/
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC-4000A 型 气相色谱仪	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	AWA6228 功能 声级计 AWA6021A 级 校准器	/

2、人员能力

参加本次验收的所有采样与现场监测人员、实验分析人员、检测报告编制人员、质控人员等，均经过岗前培训，全部人员持证上岗。

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 严格按照验收方案展开监测工作。
- (2) 废气严格按照相关要求进行现场采样、运输、分析。
- (3) 采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。
- (4) 采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。

4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准，前后相差在 0.5dB（A）以内。

表六

验收监测内容： 1、验收监测期间工况检查 在监测期间，湖南广立汽车零部件有限公司主体工程运行工况稳定、环保设施运行正常，当工况异常或环保设施运行异常等情况出现时，由建设单位相关人员通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。 2、验收监测方案 通过对项目生产现场的踏勘，了解项目的生产工艺及流程，调查和分析了项目营运生产中各类污染物的产生情况、主要的污染因子、污染物治理设施、污染物排放的实际状况等情况后，本项目验收监测内容见下表。					
表 6-1 项目竣工环保验收监测方案					
监测项目	监测点位		监测因子	监测频次	执行标准
无组织废气	G1：厂界上风向		非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度	连续采样 2 天，等时间间隔采集 3 次样品	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 《恶臭污染物排放标准》表 1 二级新改扩
	G2：厂界下风向				
	G3：厂界下风向				
有组织废气	处理前	G4：环保设备进气管道	颗粒物、甲醛、非甲烷总烃、臭气浓度	连续采样 2 天，等时间间隔采集 3 次样品	/
	处理后	DA001	颗粒物、甲醛、非甲烷总烃、臭气浓度		《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 《恶臭污染物排放标准》表 2
噪声	N1：厂界东侧 1 米处		等效连续 A 声级 Leq(A)	连续监测 2 天，昼夜各一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类
	N2：厂界南侧 1 米处				
	N3：厂界西侧 1 米处				
	N4：厂界北侧 1 米处				

表七

验收监测期间生产工况记录:

2023年11月13日-14日对湖南广立汽车零部件有限公司项目竣工环境保护验收进行了现场监测。为了保证监测资料的有效性和准确性,要求企业达到验收监测的技术要求。在验收监测期间,全厂生产设备、环保设施运行正常,验收期间生产工况见下表。

表 6-1 监测期间生产情况

监测日期	环评设计生产能力	实际生产能力	生产负荷
11月13日	汽车卡扣 3333 件	汽车卡扣 2000 件	60.01%
	汽车风道总成 2233 件	汽车风道总成 1500 件	67.17%
	驾驶座车枕 1667 件	0	0
11月14日	汽车卡扣 3333 件	汽车卡扣 2000 件	60.01%
	汽车风道总成 2233 件	汽车风道总成 1500 件	67.17%
	驾驶座车枕 1667 件	0	0

验收监测结果:

1、废气

厂区监测期间气象参数见表 7-1,无组织监测结果见表 7-2,有组织监测结果见表 7-3。

表 7-1 气象参数一览表

检测日期	天气	风向	风速(m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	湿度(%)
2023.11.13	多云	北	1.4~1.7	10.7~14.4	101.3~101.4	68~69
2023.11.14	多云	北	1.4~1.6	11.2~15.7	98.9~99.0	73~74

表 7-2 厂界无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测结果 (mg/m ³)				建议参考标准限值 (mg/m ³)
		点位名称	厂界上风向 G1	厂界下风向 G2	厂界下风向 G3	
2023.11.13	颗粒物	第一时段	0.133	0.300	0.350	1.0
		第二时段	0.117	0.367	0.317	
		第三时段	0.167	0.283	0.333	
	非甲烷总烃	第一时段	0.39	0.73	0.79	4.0
		第二时段	0.43	0.77	0.77	
		第三时段	0.42	0.75	0.74	
	臭气浓度 (无量纲)	第一时段	11	14	15	20 (无量纲)
		第二时段	11	15	15	
		第三时段	12	15	16	

2023. 11.14	颗粒物	第一时段	0.117	0.333	0.367	1.0
		第二时段	0.150	0.300	0.350	
		第三时段	0.133	0.317	0.283	
	非甲烷 总烃	第一时段	0.41	0.72	0.76	4.0
		第二时段	0.44	0.78	0.78	
		第三时段	0.45	0.76	0.72	
	臭气浓度 (无量纲)	第一时段	11	16	15	20 (无量纲)
		第二时段	11	16	16	
		第三时段	12	16	15	

根据检测结果，项目验收监测期间无组织废气中的非甲烷总烃、颗粒物厂界上下风向检测指标测试结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准限值。臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值。

表 7-4 有组织废气检测结果

采样日期	点位名称	检测项目		实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	建议参考 标准限值 (mg/m ³)	处理 效率
2023. 11.13	处理 前环 保设 备进 气管 道 G4	非甲烷 总烃	第一次	4.23	0.069	/	/
			第二次	4.27	0.068		
			第三次	4.31	0.069		
		甲醛	第一次	2.1	0.034	/	/
			第二次	2.1	0.034		
			第三次	2.2	0.035		
		颗粒物	第一次	4.3	0.070	/	/
			第二次	4.2	0.067		
			第三次	4.5	0.073		
		臭气浓度 (无量纲)	第一次	3090		/	/
			第二次	3090			
			第三次	3090			
	标干流量 (m ³ /h)	第一次	16395		/	/	
		第二次	15984				
		第三次	16120				
烟道截面积:0.2827m ²							
处理 后 DA0 01	非甲烷 总烃	第一次	0.91	0.014	60	78.46%	
		第二次	0.91	0.014			
		第三次	0.94	0.014			
	甲醛	第一次	0.6	0.009	5	71.86%	
		第二次	0.6	0.009			
		第三次	0.6	0.009			

		颗粒物	第一次	1.5	0.023	20	71.49%
			第二次	1.2	0.018		
			第三次	1.1	0.017		
		臭气浓度 (无量纲)	第一次	733		2000	76.28%
			第二次	733			
			第三次	733			
		标干流量 (m ³ /h)	第一次	15614			
			第二次	15185			
			第三次	15353			
		排气筒高度:15m 烟道截面积:0.2827m ² 处理设备: 活性炭吸附					
2023. 11.14	处理 前环 保设 备进 气管 道 G4	非甲烷 总烃	第一次	4.53	0.071	/	/
			第二次	4.35	0.067		
			第三次	4.45	0.067		
		甲醛	第一次	2.1	0.033	/	/
			第二次	2.2	0.034		
			第三次	2.2	0.033		
		颗粒物	第一次	4.6	0.072	/	/
			第二次	4.5	0.069		
			第三次	4.4	0.066		
		臭气浓度 (无量纲)	第一次	3090		/	/
			第二次	3090			
			第三次	3090			
		标干流量 (m ³ /h)	第一次	15590			
			第二次	15301			
第三次	14969						
烟道截面积:0.2827m ²							
2023. 11.14	处理 后 DA0 01	非甲烷 总烃	第一次	0.95	0.014	60	77.18%
			第二次	1.04	0.015		
			第三次	1.05	0.015		
		甲醛	第一次	0.6	0.009	5	72.29%
			第二次	0.6	0.009		
			第三次	0.6	0.009		
		颗粒物	第一次	1.5	0.022	20	70.39%
			第二次	1.2	0.018		
			第三次	1.3	0.019		
		臭气浓度 (无量纲)	第一次	733		2000	76.28%
			第二次	733			
			第三次	733			
		标干流量 (m ³ /h)	第一次	14696			
			第二次	14696			
第三次	14495						
排气筒高度:15m 烟道截面积:0.2827m ² 处理设备: 活性炭吸附							

根据检测结果，项目验收监测期间有组织废气中的非甲烷总烃、甲醛和颗粒物检测指标测试结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值。臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值要求。

2、噪声

厂界噪声监测结果见表7-5。

表7-5 噪声检测结果

点位名称	检测项目	检测结果				单位
		2023.11.13		2023.11.14		
		昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界外东侧 1m 处△N1	厂界噪声	51	45	50	44	dB(A)
厂界外南侧 1m 处△N2		52	45	52	45	
厂界外西侧 1m 处△N3		54	46	53	46	
厂界外北侧 1m 处△N4		56	47	56	47	
标准限值		60	50	60	50	dB(A)

根据监测结果，验收监测期间项目厂界噪声等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB212348-2008）2类标准限值，厂界噪声达标排放。

4、污染物排放总量核算

废气污染物排放总量核算采用实际监测方法，废气排放总量计算公式：

$$G = \sum Q \times N \times 10^{-3}$$

式中 G：排放总量（t/a）；

Q：各工位有组织排放排放速率平均值（kg/h），取 0.014kg/h；

N：全年计划生产时间（h/a），取 2400h/a。

非甲烷总烃排放量：0.014kg/h×2400h×10⁻³=0.0336 吨/年；

本项目批复文件中未设置总量控制指标要求，现阶段总量控制指标未超过环评中要求的排放总量控制限值（0.605t/a）。

表八

验收监测结论:

1、项目概况

湖南广立汽车零部件有限公司租赁租用浏阳市盛大家具厂空置的厂房及土地，利用现厂房的前提下，新建一栋钢构厂房，进行塑料汽车零部件制品的生产。项目总投资 600 万元，生产规模为项目生产规模为年产卡扣 100 万件、汽车风道总成 67 万件、驾驶座车枕 50 万件。因目前仅建设部分生产设备，本次为阶段性验收，现生产规模为年产卡扣 67 万件、汽车风道总成 45 万件。

根据现场勘查，项目实际建设内容及规模与环评阶段建设内容及规模相比，环评阶段与验收阶段建设地点、生产工艺未发生改变，验收阶段总占地面积、建筑面积、主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程较环评阶段未发生重大变化，不涉及生产规模的变化，无重大变更。

2、验收监测结论

(1) 废水监测结果

项目无生产废水外排。

(2) 废气监测结果

根据检测结果，项目验收监测期间无组织废气中的非甲烷总烃、颗粒物厂界上下风向检测指标测试结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中标准限值。臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准限值。项目验收监测期间有组织废气中的非甲烷总烃、颗粒物和甲醛检测指标测试结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中标准限值。臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中排放限值要求。

(3) 噪声监测结果

根据监测结果，验收监测期间项目厂界噪声等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB212348-2008）2 类标准限值，厂界噪声达标排放。

3、总体结论

项目符合国家产业政策，通过监测和现场环保检查，项目工程已按设计要求进行建设，项目的建设执行了环境保护“三同时”要求，验收监测期间项目环保设施已安装并投入正常运行使用。通过现场检查，项目基本落实了设计、环评要求

和其它的环境保护管理要求。根据本次环境保护竣工验收现场采样及分析，项目产生的废气和噪声均能达标排放；另外经现场调查，固体废弃物、废水均能得到妥善处置，项目排放的污染物对环境影响较小。

综上所述，项目所采取的环保对策措施均基本满足环评及批复的要求。


4、建议


(1) 定期对污染控制设施设备、收集系统进行维护、保养、检修，建立日常运行台账，确保污染控制设施正常运行，并依法依规定期监测。

(2) 加强员工环保意识。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南广立汽车零部件有限公司

 填表人（签字）： 

 项目经办人（签字）： 


建设项目	项目名称	湖南广立汽车零部件有限公司建设项目				项目代码	/			建设地点	浏阳市北盛镇乌龙社区		
	行业类别（分类管理名录）	C3670 汽车零部件及配件制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改			中心经纬度	东经 113° 25' 34.72317" 北纬 28° 17' 4.77106"		
	设计生产能力	年产汽车卡扣 100 万件；汽车风道总成 67 万件；驾驶座车枕 50 万件				实际生产能力	年产汽车卡扣 67 万件；汽车风道总成 45 万件（本次为阶段性验收）			环评单位	湖南亿兴环保技术咨询服务有限公司		
	环评文件审批机关	长沙市生态环境局				审批文号	长环评（浏阳）【2022】122 号			环评文件类型	环境影响报告表		
	开工日期	2022 年 6 月				竣工日期	2023 年 11 月			排污许可证申领时间	/		
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位	/			本工程排污许可证编号	/		
	验收单位	湖南广立汽车零部件有限公司				环保设施监测单位	/			验收监测时工况	正常运行		
	投资总概算（万元）	600				环保投资总概算（万元）	25			所占比例（%）	4.17		
	实际总投资（万元）	600				实际环保投资（万元）	20			所占比例（%）	3.33		
	废水治理（万元）	3	废气治理（万元）	15	噪声治理（万元）	0.5	固体废物治理（万元）	1.5		绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/
新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力	/			年平均工作时	2400			
运营单位		湖南广立汽车零部件有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			91430181MA4Q39LC0A	验收时间		2023 年 11 月	
污染物排放达总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	动植物油	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业粉尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
与项目有关的其他特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
